

# 福祉生活病院常任委員会資料

(平成30年4月20日)

## 【件名】

- 1 中央病院建替整備工事の進捗状況等について（病院局総務課）…………… 1

病 院 局

# 中央病院建替整備工事の進捗状況等について


平成30年4月20日  
病院局総務課

平成30年4月現在の中央病院建替整備工事の進捗状況について報告します。

記

## 1 進捗状況

- 鉄骨工事は1月に完了。
- 外部工事は最上階（11階）までの外壁材の設置が完了し、外壁塗装等を進めているところであり、内部工事については間仕切り壁設置、内装仕上げ工事等を施工中。
- 設備工事についても屋内空調工事等、進捗を図っており、5月下旬には電源の引込み工事（受電）が完了する予定。

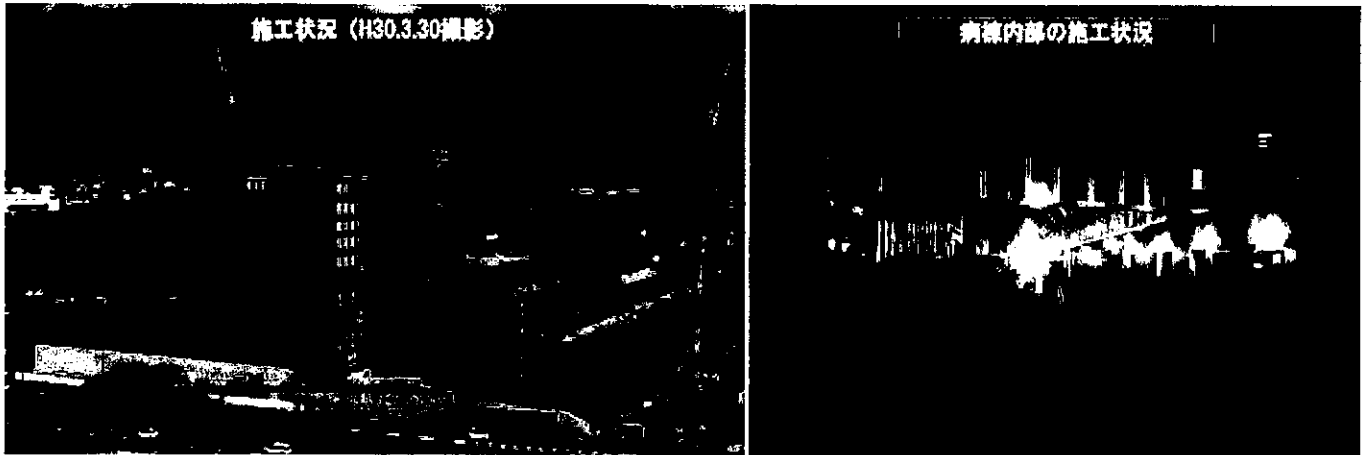

## 2 全体の進捗予定

区 分		H28	H29	H30	計
工事 進 捗	出来高割合	5.5%	51.0%	43.5%	100.0%
	主な内容	・材料調達 ・杭打ち ・基礎工事着手	・H29.9、免震装置設置完了 ・鉄骨工事(躯体完成)	・内装仕上げ ・設備工事仕上げ	・H30.9完成後、引越 ・H30.12オープン

## 3 スケジュール（予定）

### (1) 当面（本館新築部分）

時 期	H29				H30					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
内 容	→ 鉄骨工事				↔ 検査・調整 (完成)					
	←				→ 外部工事		→ 内装・設備工事等			

○完成式・内覧会について（素案）

平成30年12月上旬（土曜又は日曜）に実施予定

### (2) 全体

区 分	H28	H29	H30	H31	H32
新病院建設工事 (本館新築)	8～9月		9月 12月 ← オープン →		
(外来棟先行改修)			8月 10月 ↔		
外来棟改修(本格改修)				1月 10月 ↔	
本館解体・駐車場整備				1月	3月 ↔
