



浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5693
用地課 TEL:0796(82)5683

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。橋梁等を各工区で工事中です。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


釜谷地区

釜屋地区では現在、擁壁部の工事を行っています。4基の橋台工事(①)は5月末に完了しました。擁壁部の工事(②)は7月末に完了する予定です。7月末以降は橋を架ける工事、トンネル工事を行います。重機の搬入等ありますが、安全に配慮しながら工事を進めていきます。



栢谷地区


5月から埋蔵文化財本発掘調査を開始しました。IC西側の山の尾根沿いに弥生～古墳時代のお墓等の遺跡があり、遺跡を詳細に調査し、記録・整理・保存をします。手作業で遺跡を傷つけないよう丁寧に掘っていきます。

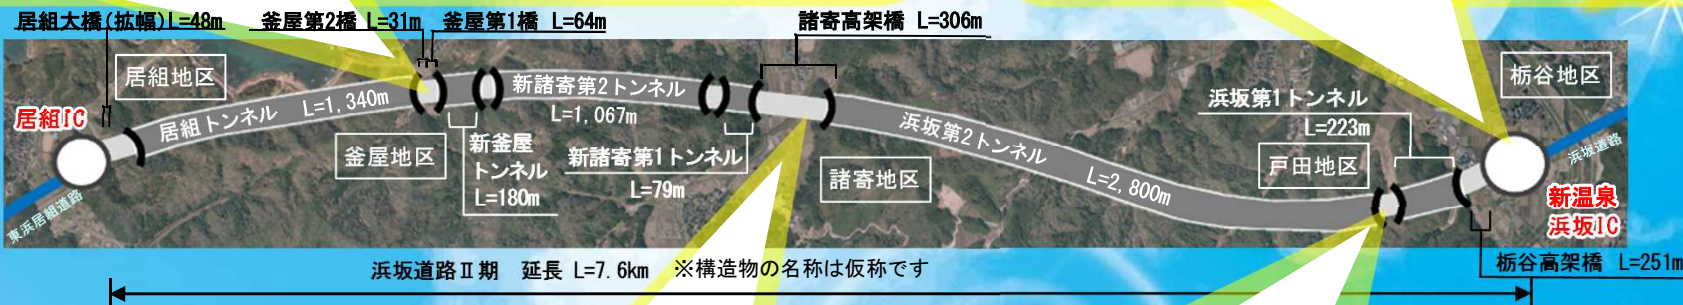

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のピックス等を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

諸寄地区

諸寄高架橋の4基の橋脚(①)の完成が目前となりました。7月末には完成した背の高い橋脚が並ぶこととなります。また、浜坂側へ続くトンネルの入り口付近(②)の伐採作業が完了し、浜坂道路が通るルートがイメージがしやすくなりました。

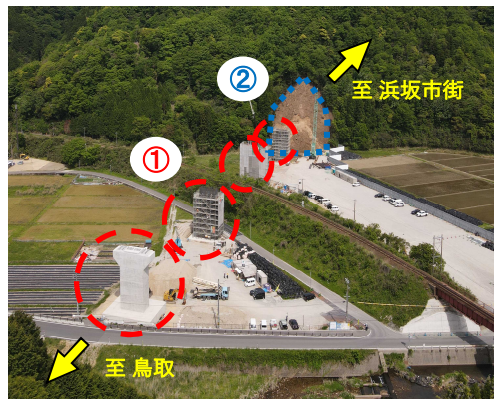

戸田地区

浜坂道路Ⅱ期事業の最長のトンネルである浜坂第2トンネルは延長2800mで、東西(戸田地区及び諸寄地区)の両方から掘削します。東工区は延長1528mで、昨年の12月から掘削を開始し、現在坑口から約400m付近まで掘削が進んでいます。





日野谷工区 牧谷トンネル



日野谷工区では、牧谷トンネルと東浜トンネルとを繋ぐ盛土工事がCT施工により順調に進んでいます(左写真)。今後、標識基礎や水路工事也开始の予定です。
また、牧谷トンネル内では、トンネル舗装工事が始まっており、現在は、中央分離帯の防護柵基礎工事や左右端の円型側溝の施工が進んでいます(右写真)。

東浜工区



東浜工区では、笹原橋から豊岡方面に向かって、盛土工事、水路工事、法面工事など多くの工事が進んでいます(左写真)。
また、東浜IC付近では、現在の国道178号を日本海側へ切り替える工事が行われています(右写真)。6月末には切り替わり、東浜IC周辺の工事をさらに進めていきます。

浦富東工区



浦富高架橋では、橋面の工事が本格的に始まりました。現場では、中央分離帯や車の落下を防止するための壁高欄の施工が進んでいます(左写真)。
また、浦富ICの豊岡方面へのオンランプでは、ランプ橋の床版コンクリートの工事が進んでいます(右写真)。この床版コンクリートは、10月頃に完成予定です。



東浜トンネル



東浜トンネル内では、開通に向けてよいトンネル照明などのトンネル内の電気設備系の工事が始まっています。

【岩美道路/フェイスブック/インスタグラム】

岩美道路では、日々の整備状況や土木の魅力幅広くPRするため、ホームページのほかにも、公式SNS(インスタグラムやフェイスブック)を開設しています。公式SNSでは、岩美道路の日々の工事状況や現場での出来事など幅広い情報を投稿しています。こちらも、ぜひご覧ください！

