



# 岩美道路だより


令和4年2月号(第30号)

《事業実施担当窓口》

鳥取県土整備事務所 山陰道・岩美道路推進室

電話 0857-20-3612・3614・3578

E-mail tottori\_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp

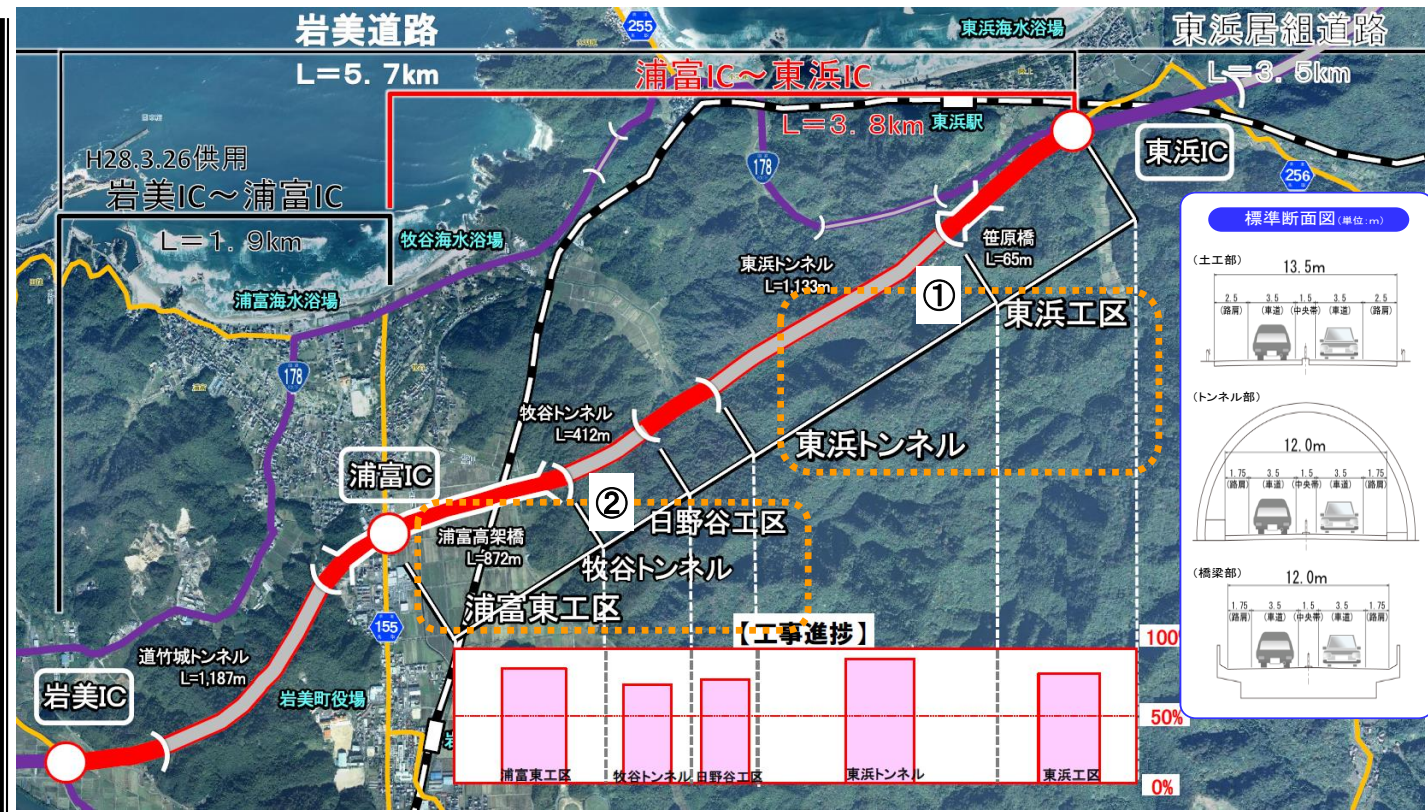

## ①東浜工区及び東浜トンネルの状況について

東浜工区では、区間全体で大規模な山切及び盛土工事が順調に進み、完成形がイメージできるようになりました。また、東浜インターチェンジのボックスカルバートも完成し、その姿が現れました！今後は、山切工事で切り終えた斜面を安定させるための法面工事なども進めていきます。

東浜トンネルと東浜工区を繋ぐ笹原橋では、床版コンクリートの打設が完了しました！今後は、コンクリートの壁高欄の施工を行い、完成を目指します。

東浜トンネルの内部では、コンクリート舗装が完成し、現在は、左右端に設置する配管工事や点検通路の施工が順調に進んでいます。引き続き、照明工事等を進めていきます。




## ②日野谷工区～浦富高架橋の状況について



日野谷工区では、日野谷川を跨ぐアーチカルバートとその取り付け部分の盛土を支える直壁の補強土壁や補強盛土の施工が進み、牧谷トンネルと東浜トンネルを繋ぐ大規模盛土が繋がりました！

春以降、完成高さまでさらに補強土壁や盛土工事が続きます！

また、隣接する牧谷トンネルでは、トンネル内部の防水シートや覆工コンクリートの施工が進んでいます。4月末には、このトンネル工事が完成する予定です♪

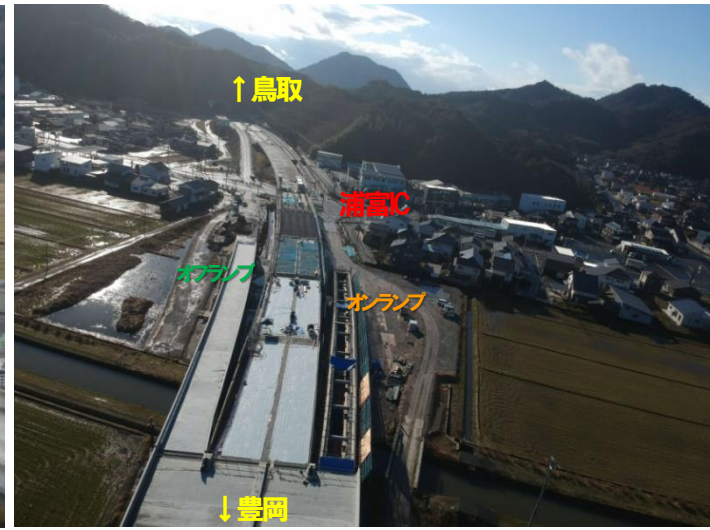

浦富高架橋では、床版コンクリートの施工が進んでいます。春には岩美道路本線の床版コンクリートの施工が完了する予定です♪また、インターチェンジのオンランプ・オフランプも完成形が見えてきました！

今後は、浦富高架橋の表面（橋面防水や橋面舗装など）の工事が本格化していきます。

## お知らせ

今回は、トンネル内部の覆工コンクリートが完成する牧谷トンネルなどの様子を中心に紹介します。

今後も「岩美道路だより」をよろしくお願いします^^！

【ホームページ】岩美道路の概要や進捗状況、最新のピックを掲載しています。こちら、ぜひご覧ください！！



【Instagram / フェイスブック】岩美道路の整備状況や土木の魅力を幅広くPRするため、公式SNS(Instagramやフェイスブック)を開設しています！公式SNSでは、岩美道路の日々の工事状況や現場での出来事、さらには周辺の観光情報まで幅広い情報を投稿しています。こちら、ぜひご覧ください！！「いいね！」や「フォロー」もよろしくお願いします^^！



Instagram

Facebook

