

【佐治川ダム】令和5年台風第7号による異常堆積土砂の撤去完了


R7.1 鳥取県土整備事務所 河川砂防課

- ・台風よりダム上流域で山林崩落等が発生し、貯水池内に土砂等約10万m³が堆積。
⇒ これによりダム洪水調節容量の7.5%を喪失。
- ・発災直後から専決予算等を活用し、災害査定を待たずに土砂等撤去に着手。
- ・令和6年12月、災害復旧事業による最終工区の撤去工事が完了。


【工事概要】土砂撤去V=115,000m³、流木撤去V=2,200m³

【工事期間】令和5年8月～令和6年12月

【備考】撤去した土砂は、他の災害復旧事業や北条道路等で利用することで残土処分量を抑制。

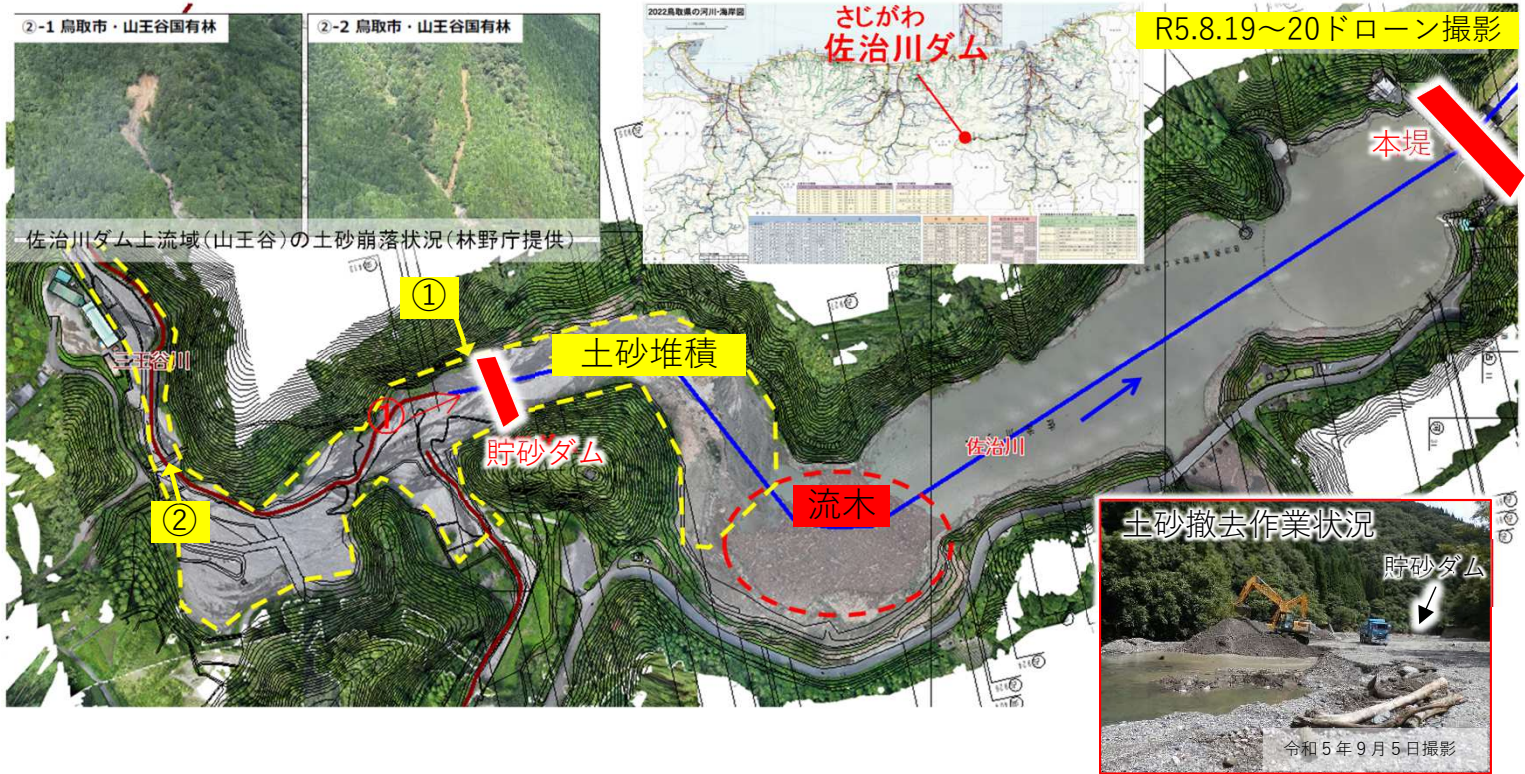

撤去範囲

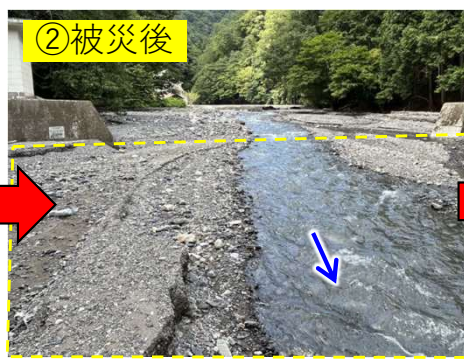

撤去範囲
